



sondages géologiques - essais pénétrométriques et pressiométriques - forages - études géotechniques et hydrogéologiques - diagnostics de pollution


LIEVIN (62)	
Référence Devis	DS26-0430
Nature des travaux	Reconnaitances géotechniques
Chargé d'affaire	CC
Client	COQUART.EU (ENEDIS)
Durée prévue sur site	

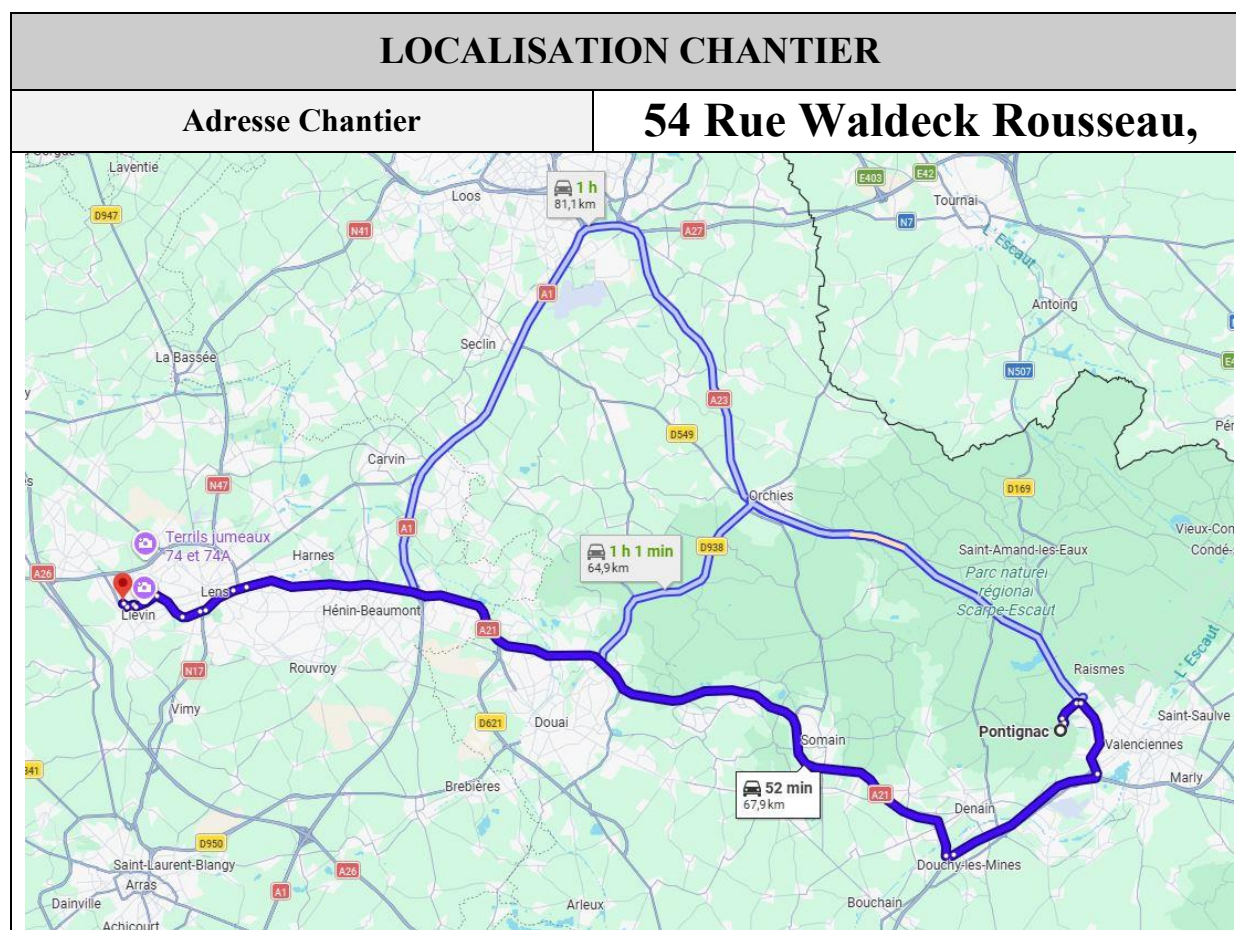

sondages géologiques - essais pénétrométriques et pressiométriques - forages - études géotechniques et hydrogéologiques - diagnostics de pollution

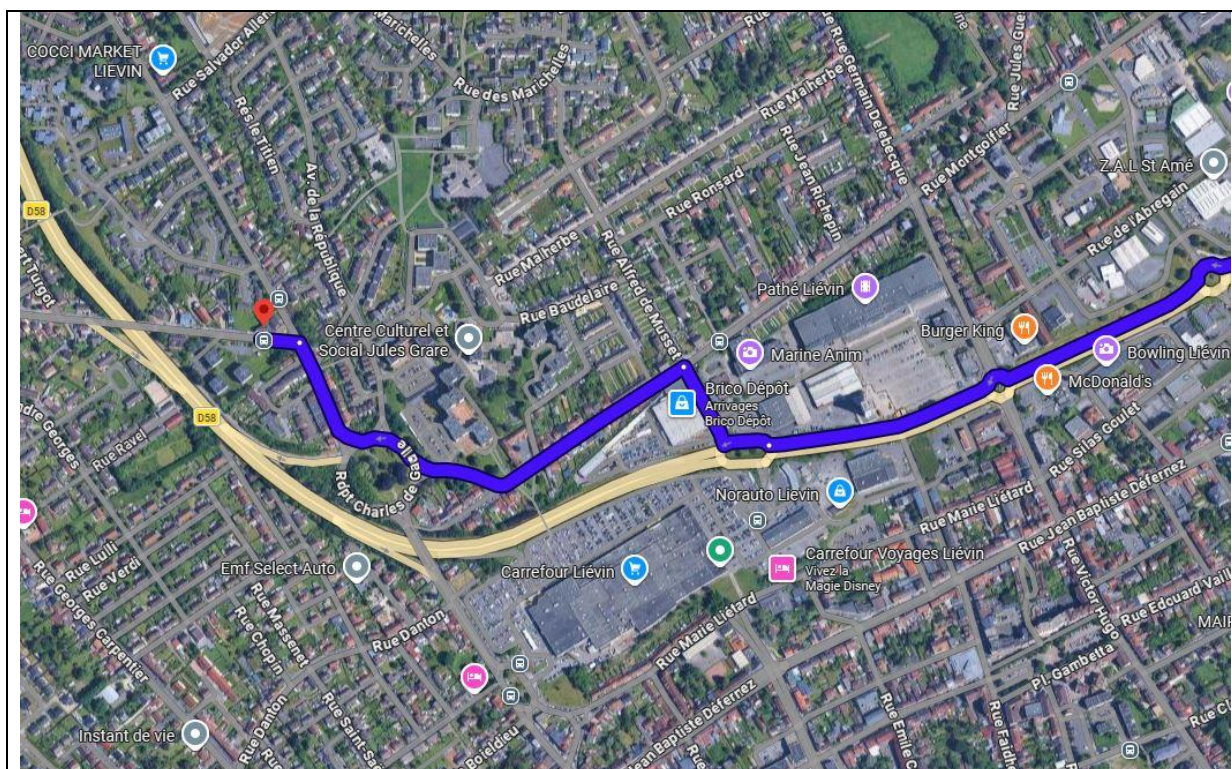

sondages géologiques - essais pénétrométriques et pressiométriques - forages - études géotechniques et hydrogéologiques - diagnostics de pollution

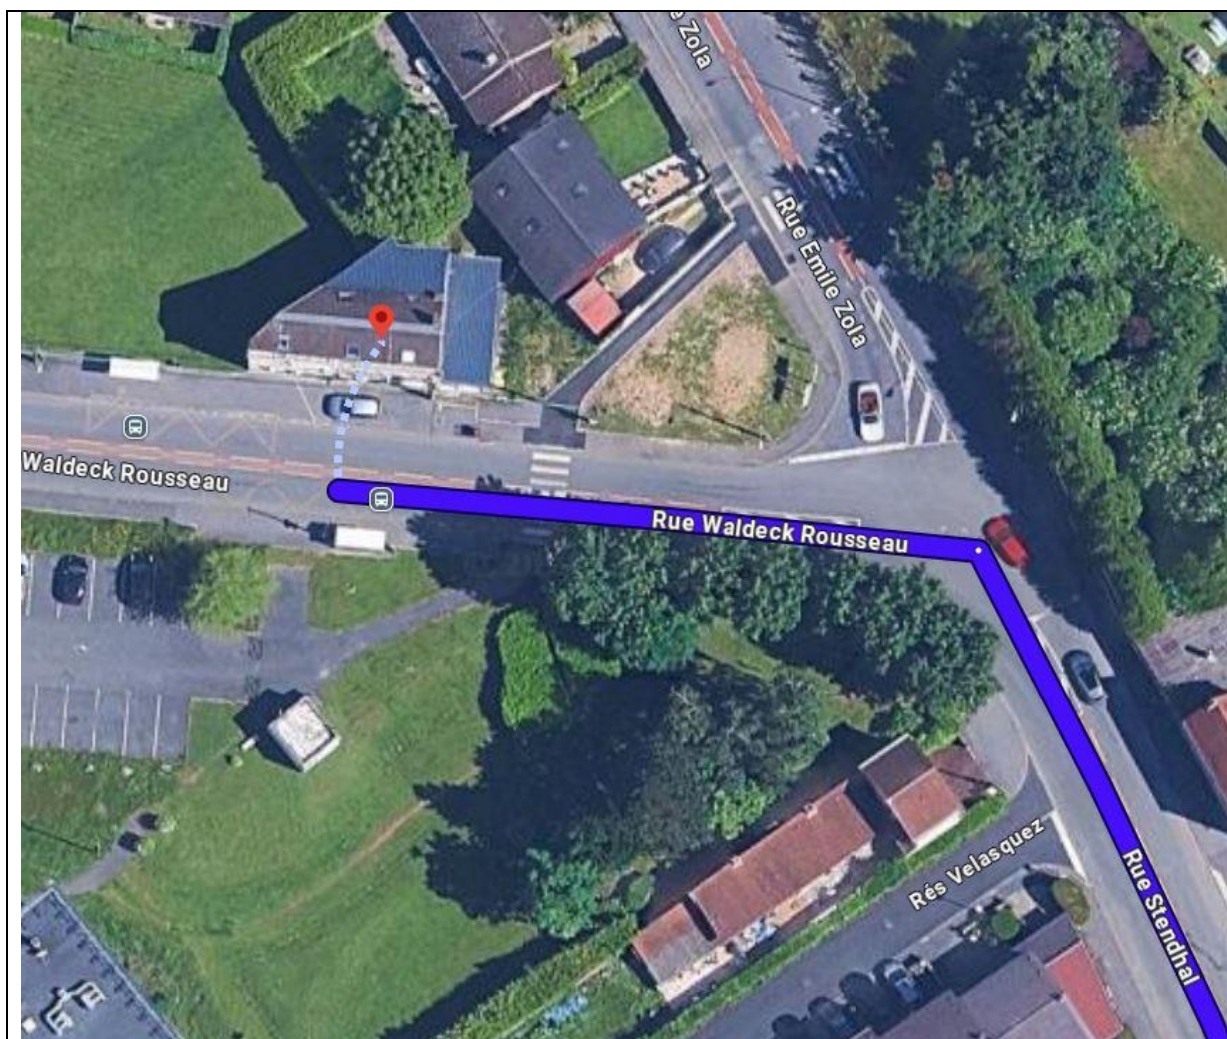

CONTACT SUR SITE

TRAVAUX A REALISER

- 1 sondage pressiométrique à 7 m avec 4 essais (1.5/3/4.5/6) (bien remplis les sacs de limon)

Echantillons tout le 25cm max sur les 2 premier mètres

GEOLOGIE PREVISIONNELLE

- Géologie : Limons / Craie

PIEZOMETRIE PREVISIONNELLE

ORGANISATION DE CHANTIER	
Implantation sur site	A Fair
Repérage des réseaux enterrés	A Fair
Arrêtés de circulation / Autorisations	
Accueil Sécurité / Plan de Prévention	-

INSTALLATION DE CHANTIER	
Base vie	Non
Signalisation routière	A mettre
Balisateur du chantier	A mettre
Alimentation en eau	Non
Alimentation électrique	Non
Gestion des boues et cuttings	Propre
Gestion des eaux de pompage	Propre

CONSIGNES SPECIFIQUES

Réseaux enterrés	Oui
Enregistrement électronique (Forages et Essais)	Oui

MATERIELS SPECIFIQUES

Tonnes à eau // Cuve	Oui
Carotteuse Béton	Non
Marteau Piqueur Electrique	Non
Tarière à Main pour avant-trou	Oui
Plaques de roulement	Non
Bastaing bois pour franchissement bordures ou fossés	Non
Cônes de chantier	Oui
Barrières de Chantier	Oui
Rubalise	Oui
Compresseur	Non
Groupe électrogène	Oui
Extracteur d'air / Gaz	Non
